

경상남도교육청

신설학교 추진현황

2021. 9.



신설학교 추진현황

2021. 9. 25. 현재

사업명	(가칭)사송1유치원 신축공사		학급수	15 (일반12,특3)	개교 예정일	2022. 3. 1.	
개요	위치	양산시 동면 내송리 495-1		발주청 담당자	건축	시설7급 김민석	
	부지면적	4,000㎡			토목	시설7급 김민석	
	연면적	4,455㎡			기계,소방(설비)	공업8급 김노업	
설계 및 협의	시행일	2020. 4. 6.		공사	전기,통신,소방	공업7급 김희수	
	계약일	2020. 7.20.			시행일	2020.12.31.	
	용역기간 (기본+실시)	2020. 7.27.~ 2020. 12. 23.			계약일	2021. 3. 9.	
	시행계획협의	2021. 2. 4.			공사기간	2021. 3.11.~ 2022. 2. 3.	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 지상3층 바닥 철근 배근 및 거푸집 조립 * 전기,통신,소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 전기공사: 지상3층 바닥 매입 배관 작업 - 통신공사: 지상3층 바닥 매입 배관 작업 - 소방공사: 지상3층 바닥 슬리브 작업 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 지하층 위생배관 공사,지상3층 바닥슬리브 설치 					공정률 (진행/예정)	31% / 35%




현황 사진

신설학교 추진현황

2021. 9. 25. 현재

사업명	(가칭)무릉유치원 신축공사	학급수	17 (일반15,특2)	개교 예정일	2022. 3. 1.	
개요	위치	창원시 의창구 북면 무동리 103-1		발주청 담당자	건축	시설8급 조영중
	부지면적	8,000㎡			토목	시설6급 신원철
	연면적	5,457.15㎡			기계,소방(설비)	공업8급 이민우
설계 및 협약	시행일	2020. 2. 12.		공사 도급자	전기,통신,소방	공업6급 이태원
	계약일	2020. 7. 29.			시행일	2020. 12. 29.
	용역기간 (기본+실시)	2020. 7. 31.~ 2020. 12. 27.			계약일	2021. 3. 19.
	시행계획협의	2020. 12. 22.			공사기간	2021. 3. 22.~ 2022. 1. 30.
					도급자	(건축) ㈜만경종합건설 대표 이현오 (전기) ㈜에스제이전력 대표 김현철 (통신) ㈜세인텍 대표 신승우 (소방) 중앙건설㈜ 대표 손명섭 (기계) ㈜제이엠모터스펌프 대표 이영훈
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 3층 벽체 철근배근 및 거푸집설치 * 전기, 통신, 소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 4층 벽체배관 작업 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 위생배관작업 - 급식소 덕트작업 				공정률 (진행/예정)	37% / 40%

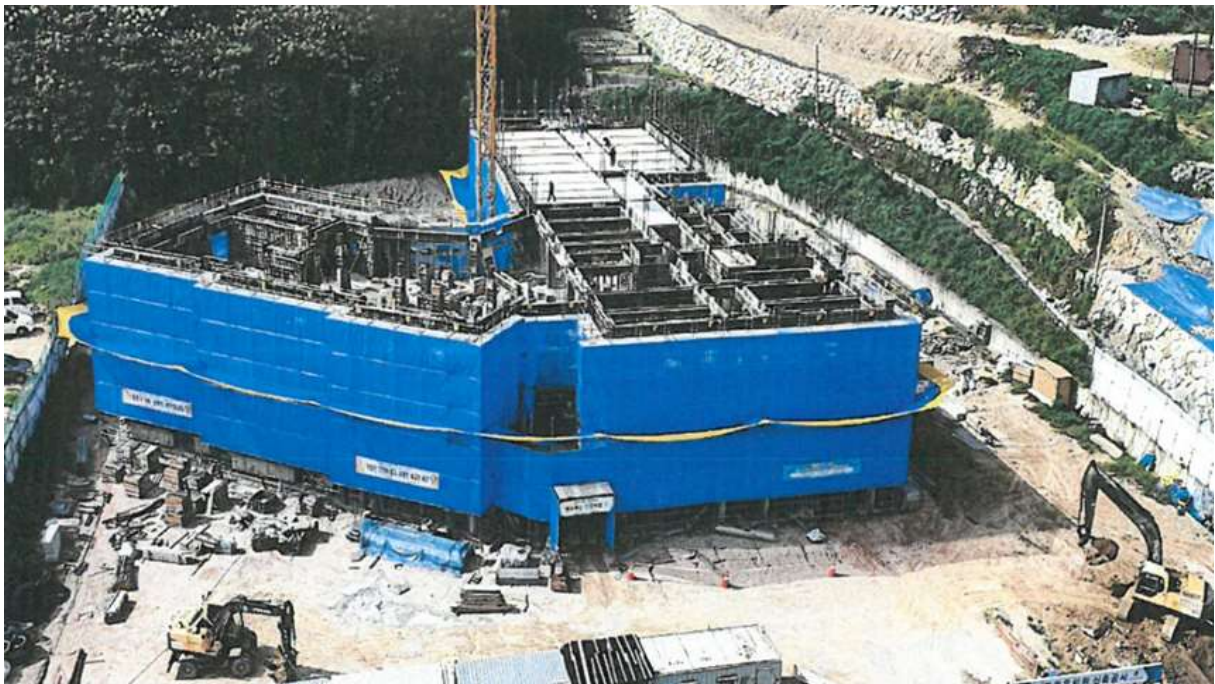

현황 사진

신설학교 추진현황

2021. 9. 25. 현재

사업명	(가칭)창원 숲 유치원 신축공사	학급수	6 (일반6)	개교 예정일	2022. 3. 1.	
개요	위치	창원시 성산구 중앙동 108		발주청 담당자	건축	시설7급 김종훈
	부지면적	8,500㎡			토목	시설7급 신원철
	연면적	1,895.55㎡			기계,소방(설비)	시설8급 이민우
설계 및 협약	시행일	2019. 12. 23.		공사	전기,통신,소방	공업9급 양동헌
	계약일	2020. 7. 8.			시행일	2020. 12. 30.
	용역기간 (기본+실시)	2020. 7. 9.~ 2020. 12. 30.			계약일	2021. 3. 15.
	시행계획협의	2021. 3. 18.			공사기간	2021. 3. 22.~2022. 1. 15.
					도급자	(건축) 메이드건설(주) 대표 박광신 (전기) 대연전력 대표 정경숙 (통신) ㈜경남네트워크 대표 김지영 (소방) 창명소방공사 대표 김창호 (기계) 금광종합건설(주) 대표 김종곤
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 적벽돌 조적, 옥상비노출우레탄 방수, 창호 프레임 설치 * 전기, 통신, 소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - TRAY설치작업 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 위생배관작업 - 급식소 덕트작업 				공정률 (진행/예정)	46% / 47%



현황 사진

신설학교 추진현황

2021. 9. 25. 현재

사업명	사송1초 교사 신축공사	학급수	44 (일반42,특2)	개교 예정일	2022. 9. 1.		
개요	위치	양산시 동면 내송리 502-6		발주청 담당자	건축	시설6급 양지원	
	부지면적	14,000.0㎡			토목	시설6급 김형규	
	연면적	13,7725.52㎡			기계,소방(설비)	공업7급 이경훈	
설계 및 협약	시행일	2020. 5. 8.		공사 도급자	전기,통신,소방	공업6급 박진경	
	계약일	2020. 6. 2.			시행일	2021. 1. 7.	
	용역기간 (기본+실시)	2020. 6. 4.~ 2020.11.30.			계약일	2021. 3.29.	
	시행계획협약	2020.11.16.			공사기간	2021. 4. 7.~ 2022. 6.30.	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교사동 철근콘크리트공사(1층 기둥,벽체 철근배근 및 거푸집 설치) - 식당동 철근콘크리트공사(1층 바닥 철근배근,콘크리트 타설) - 강당동 철근콘크리트공사(지중보 철근배근,콘크리트 타설) * 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 가시설희막이공사 구조물 기초 터파기 - 구조물 기초 철근콘크리트공사 * 전기,통신,소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 전기,접지공사 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 화장실 오,배수 인입 슬리브 설치 					공정률 (진행/예정)	27% / 30%



현황 사진

신설학교 추진현황

2021. 9. 25. 현재

사 업 명	신진주초 교사 신축공사	학 급 수	44 (일반36,특1,유7)	개교 예정일	2022. 3. 1.	
개 요	위 치	진주시 가좌동 429		공사감독관	건 축	시설8급 송경찬
	부지면적	12,491.00㎡			토 목	시설7급 진상진
	연 면 적	14,035.61㎡			기계,소방(설비) 전기,통신,소방	공업7급 이경훈 공업6급 박진경
설 계 및 협 의	시 행 일	2019. 9. 11.		공 사	시 행 일	2020. 6. 4.
	계 약 일	2019. 9. 24.			계 약 일	2020. 9. 9.
	용역기간 (기본+실시)	2019. 9. 25.~ 2020. 4. 5.			공사기간	2020. 9. 21.~ 2021. 12. 14.
	시행계획협의	2020. 3. 30.			도 급 자	(건축) 대광건설(주) 성태욱 (전기) ㈜대성일렉트릭 성향자 (통신) ㈜일렉콤 정현영 (소방) 경림전기(주) 김인형 (기계) 대한기술(주) 손종근
작업내용	<p>* 건축공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 교 사 동 외벽마감 작업 중(치장벽돌, 베이스패널, 복합 판넬 하지 철물), 내부 5층 콘크리트 벽돌 쌓기. 5층 미장 및 4층 벽 타일 불임 진행 중. - 강 당 동 2층 타공흡음판 불임 - 유치원동 내부 수성페인트 - 지킴이동 골조 공사 완료. <p>* 토목공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 운동장 u형 배수로 일부 구간 콘크리트 타설 완료. <p>* 전기, 통신, 소방공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전력 간선 포설 및 교사동 5층 전등 결선 <p>* 기계설비공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 교사동 5층 화장실 위생배관공사/교사동 4층 냉난방 냉매 배관공사 				공 정 률 (진행/예정)	72% / 81%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2021. 9. 25. 현재

사업명	김해서중 교사 신축공사	학급수	31 (일반30,특1,유0)	개교 예정일	2022. 3. 1.		
개요	위치	김해시 주촌면 선지리 산68		발주청 담당자	건축	시설6급 이창우	
	부지면적	12,499㎡			토목	시설7급 진상진	
	연면적	11,337.78㎡			기계,소방(설비) 전기,통신,소방	공업7급 이경훈 공업6급 박진경	
설계 및 협 의	시행일	2020. 2. 4.		공사	시행일	2020. 9.25.	
	계약일	2020. 2.25.			계약일	2020.11.27.	
	용역기간 (기본+실시)	2020.2.26.~ 2020. 8.23.			도급자	공사기간	2020.12. 7.~ 2021.12.31.
	시행계획협의	2020. 9.15.					(건축) 금명종합건설(주) 양호준 (전기) 뉴성진파워(주) 박기철 (통신) (주)케이엔티 이공우 (소방) (주)세한소방 남흔경 (기계) 우경테크(주) 김일곤
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교사동 1층 미장, 창문인방 견, 인방상부 우레탄 도포 방수 - 교사동 2층 AI, 외부창호 사춤, 4층 조적 쌓기 - 교사동 외부계단실 레미콘 타설 - 강당동 내벽 벽체를 시공 * 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 우/오수 관로부설 및 조립식pc맨홀 설치 * 전기,통신,소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교사동 [전기/통신/소방] 입선/트레이 및 급수,오배수 배관 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 강당동 무대장치 설치, 기계 급수/오배수관 설치 					공정률 (진행/예정)	74% / 70%



현황 사진

신설학교 추진현황

2021. 9. 25. 현재

사업명	물금2교 교사 신축공사		학급수	37 (일반36,특1)	개교 예정일	2023. 3. 1.	
개요	위치	양산시 물금읍 가촌리 1277-4		발주청 담당자	건축	시설8급 송경찬	
	부지면적	15,972.10㎡			토목	시설7급 진상진	
	연면적	14,872.89㎡			기계,소방(설비)	공업7급 이경훈	
설계 및 협 의	시행일	2020. 4.24.		공사	전기,통신,소방	공업6급 박진경	
	계약일	2020. 8.20.			시행일	2021. 4.14.	
	용역기간 (기본+실시)	2020. 8.24.~ 2021. 2.19.			계약일	2021. 6.25.	
	시행계획협의	2021. 2.17.			공사기간	2021. 7. 15.~ 2022. 12. 6.	
작업내용	* 건축공사					공정률 (진행/예정)	11% / 14%
	- 시항타 및 동재하 시험 실시 - 파일 용접 부위 비파괴 검사 실시(3회) - 강당동 본항타 실시(553본중 44본 시공완료)						



현황 사진

신설학교 추진현황

2021. 9. 25. 현재

사업명	북면1고등학교 교사 신축공사	학 급 수	31 (일반30,특1)	개교 예정일	2023. 3. 1.	
개요	위 치	창원시 의창구 북면 감계리 232-3		건축	시설6급 이창우	
	부지면적	14,081.00㎡		토 목	시설7급 진상진	
	연 면 적	13,262.88㎡		기계,소방(설비)	공업7급 이경훈	
설계 및 협 의	시 행 일	2020. 4.24.		전기,통신,소방	공업6급 박진경	
	계 약 일	2020. 8.13.		시 행 일	2021. 4.20.	
	용역기간 (기본+실시)	2020. 8.14.~ 2021. 2. 8.		계 약 일	2021. 7.15.	
	시행계획협의	2021. 2.22.		공사기간	2021. 7.26.~ 2022.12.17.	
				도 급 자	(건축) 우성종합건설(주) 백승주 (전기) ㈜이수전력 김학연 (통신) ㈜해인아이엔티 구영섭 (소방) ㈜수석씨에프 조영란 (기계) 우성종합(주) 최무영	
작업내용	<p>* 건축공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 토 공 사 교사동 기초터파기 - 지정공사 헬리컬파일 시항타분 자재반입 <p>* 토목공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사토반출(함안군 칠서면 이룡리 935-2 / 21.5km) 09.25일 현재 반출 누계 7,378㎡ (설계 12,053㎡) 				공 정 률 (진행/예정)	9% / 13%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2021. 9. 25. 현재

사업명	밀양아리솔학교 교사 신축공사		학급수	18 (유1,초6,중3,전공2)	개교 예정일	2022. 3. 1.	
개요	위치	밀양시 초동면 성만1길8		공사감독관	건축	시설6급 양지원	
	부지면적	16,517㎡			토목	시설7급 진상진	
	연면적	8,842.73㎡			기계,소방(설비)	공업7급 이경훈	
설계 및 협의	시행일	2019. 9. 11.		공사	전기,통신,소방	공업6급 박진경	
	계약일	2019. 9. 25.			시행일	2020. 8. 6.	
	용역기간 (기본+실시)	2019. 9. 26. ~ 2020. 5. 4.			계약일	2020. 10. 30.	
	시행계획협의	2020. 4. 6.			공사기간	2020. 11. 23. ~ 2022. 1. 16.	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축,토목,조경공사 <ul style="list-style-type: none"> - 3층 조적공사완료, 외부 적벽돌 공사 중 - 1~3층 정벌미장 및 각층 면처리 / 1~3층 바닥몰탈 시공 - 각층 액체방수 및 우레탄보강, 담수시험 / 타일자재반입 및 소운반 - 각층 창호 프레임설치 / 경량철골 자재소운반 및 천정설치 - 복합판넬, 세라믹판넬 하지작업 중/ 베이스판넬설치 및 코킹중 - 외부인방 초벌도장 / 각층 두겹석 및 재료분리대 설치 * 전기,통신,소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 각층 분전함 메인간선 포설. 3층 배선작업 - 각층 단자함 단말처리. 옥외배관작업 - 소방펌프 입고 및 설치. 강당스프링클러 설치 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 기계실 및 각동 잔여배관 및 수압검사. 급 배기 환 설치 					공정률 (진행/예정)	56% / 54%



현황 사진
