아이(AI)의 미래를 여는 경남교육

경상남도교육청

신 · 이설학교 추진현황

2026. 9.

경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

신설학교 추진현황

2026. 9. 30.기준

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="2">주촌선천2초등학교
교사 신축공사</td><td>학 급 수</td><td colspan="2">43
(초등42, 특1)</td><td>개교 예정일</td><td colspan="2">2026. 9. 1.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">개 요</td><td>위 치</td><td colspan="7">김해시 주촌면 선지리 1469</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td colspan="7">12,060.40㎡</td></tr>
<tr><td>연 면 적</td><td colspan="7">15,771.82㎡
(지하1층/지상4층)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">설 계
및
협 의</td><td>시 행 일</td><td colspan="2">2023. 5. 17.</td><td rowspan="3">공 사</td><td>시 행 일</td><td colspan="2">2024. 4. 17.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">계 약 일</td><td colspan="2" rowspan="2">2023. 8. 22.</td><td>계 약 일</td><td colspan="2">2024. 7. 25.</td></tr>
<tr><td>공사기간</td><td colspan="2">2024.8.13.~2026.10.20.(26개월)</td></tr>
<tr><td>용역기간
(기본+실시)</td><td colspan="2">2023. 8. 25.~ 2024. 2. 20.</td><td rowspan="2">도 급 자</td><td colspan="2" rowspan="2">(건축) ㈜금호종합건설 정영우
(전기) 서진산업(주) 윤해덕
(통신) ㈜윌네트 배재철
(소방) ㈜영진소방 김상진
(기계) 한신설비(주) 한대용</td></tr>
<tr><td>시행계획협의</td><td colspan="2">2024. 3. 11.</td><td>건설사업
관리용역</td><td>대 표 사</td><td colspan="2">㈜이가종합건축사사무소 임태희</td></tr>
<tr><td>작업내용</td><td colspan="4">* 건축, 토목공사
- 옥상 폴리우레아 방수작업, 계단난간 설치, 외벽AL 판넬 설치, 계단 점자블럭 설치
- 대문 문주 콘크리트 공사, 방화문 설치, 내벽 수성페인트 도장
- 강당 마루판 설치, 선홈통 설치, 천장 설치, 바닥 플로우링 설치
- 우·오수관 설치 및 연결, 주차장 바닥 블록 깔기, 운동장 토공사, 보강토옹벽 설치
* 기계, 전기, 통신, 소방공사
- 전기사용전 검사(구내배전설비, 태양광), 스피커 설치, 콘센트·시스템박스 설치, 조명기구 설치, 옥외 보안등 설치 및 스피커·CCTV설치 작업, 빗물저류조 인입 배관 설치,
- 비상벨 및 수신기·중계기 설치, 운동장 음수대 및 살수용 매립배관 설치, 위생도기 설치
- 유도등 및 감지기 취부, 소화설비 연결 송수구 설치
- 소방시설 완공검사증명서 발부</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td><td colspan="3">93%
/
96%</td></tr>
</table>



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 9. 30.기준

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="2">진해나래울학교
교사 신축공사</td><td>학 급 수</td><td colspan="2">31
(유치원1+초등13+중등7+고등6+전공4))</td><td>개교 예정일</td><td colspan="2">2027. 3. 1.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">개 요</td><td>위 치</td><td colspan="7">창원시 진해구 장천동</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td colspan="7">17,982㎡</td></tr>
<tr><td>연 면 적</td><td colspan="7">12,444.66㎡(지상4층)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">설 계
및
협 의</td><td rowspan="2">시 행 일</td><td rowspan="2">2021. 12. 9.</td><td rowspan="4">공 사</td><td>시 행 일</td><td colspan="3">2025. 2. 17.</td></tr>
<tr><td>계 약 일</td><td colspan="3">2025. 2. 05.</td></tr>
<tr><td>계 약 일</td><td>2022. 3. 8.</td><td>공사기간</td><td colspan="3">2025.2.17.~2027.1.20.(23개월)</td></tr>
<tr><td>용역기간
(기본+실시)</td><td>2022.03.10.~ 2022.08.26.</td><td>도 급 자</td><td colspan="3">(건축) 국제건설(주) 박광국
(전기) ㈜시민전기 최진숙
(통신) ㈜다현정보통신 송은수
(소방) 선무전기공사 문진길
(기계) 브이건설(주) 노영아</td></tr>
<tr><td>시행계획협의</td><td>2022. 11. 7.</td><td>건설사업
관리용역</td><td>대 표 사</td><td colspan="3">㈜엄&이종합건축사사무소</td></tr>
<tr><td>작업내용</td><td colspan="5">* 건축, 토목공사
- 각층 미장 손보기, 장애인 램프 방통, 학부모 드랍존 방수
- 1~4층 바닥타일작업, 창호 · 유리 설치, 옥상층 외장패널 설치
- 사다리 · 트렌치 · 선홈통 설치, 치장벽돌 설치, 텍스 설치
- 바닥 테라조 설치, 내벽 바탕틀 공사, 내부 인테리어 공사
- U형 측구 설치, 맹암거 설치, 보강토옹벽 기초 타설
- 주민공동시설 보도블럭 시공
- 외부 우수받이, 집수정 및 연결관 설치
* 기계, 전기, 통신, 소방공사
- 기계실 위생배관 및 전원 풀링, 캠로드 접지, AV설비 입선
- 소방 노출배관 및 유도등, 감지기 등 입선 작업, 기계실 펌프 설치 및 배관 작업
- 각종 비구조요소 내진 설비 설치</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td><td>82%
/
77%</td></tr>
</table>



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 9. 23.기준

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="2">신항고등학교
교사 신축공사</td><td>학 급 수</td><td colspan="2">37
(일반36,특수1)</td><td>개교 예정일</td><td colspan="2">2027. 3. 1.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">개 요</td><td>위 치</td><td colspan="7">창원 진해구 용원동 1337-2일원</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td colspan="7">15,805.20㎡</td></tr>
<tr><td>연 면 적</td><td colspan="7">15,292.02㎡(지상5층)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">설 계
및
협 의</td><td rowspan="2">시 행 일</td><td rowspan="2">2024. 1. 8.</td><td rowspan="5">공 사</td><td>시 행 일</td><td colspan="3">2024.11.29.</td></tr>
<tr><td>계 약 일</td><td colspan="3">2025. 4.15.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">계 약 일</td><td rowspan="2">2024. 4. 3.</td><td>공사기간</td><td colspan="3">2025.5.15~2026.11.5(18개월)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">도 급 자</td><td colspan="3" rowspan="2">(건축) 진보토건㈜ 서민기
(전기) 청정이엔지㈜ 서정곤
(통신) ㈜장유정보통신 박영삼
(소방) 중앙건설(주) 손명섭
(기계) 동원엔지니어링 김진호</td></tr>
<tr><td>용역기간
(기본+실시)</td><td>2024. 4. 11~2024. 10. 7.</td></tr>
<tr><td>시행계획협의</td><td>2024. 11. 13.</td><td>건설사업
관리용역</td><td>대 표 사</td><td colspan="3">㈜유탑엔지니어링 이창희</td></tr>
<tr><td>작업내용</td><td colspan="5">* 건축, 토목공사
- 지킴이실 옹벽 철근 가공조립 및 거푸집, CONC 타설, 치장 벽돌 쌓기
- 화장실 방수 및 담수 테스트, 미장 잔손보기, 유리 설치
- 비구조 내진 철물 설치, 선홈통 배관 설치, 조리실 스텐판 설치
- AL복합판넬 하지틀 설치, 인테리어 및 1~2층 천장 텍스 설치, U형측구 철콘 작업, 내부 벽체 설치, L형옹벽 거푸집 및 콘크리트 타설
* 기계, 전기, 통신, 소방공사
- 케이블 포설 및 입선, 전등 입선 및 결선, 외부 통신선로 입선
- 각종 비구조요소 내진 설비 설치, HDMI케이블 입선, 지킴이실 벽체 배관 및 함체 설치, 빗물저류조 우수배관 설치, 바닥난방 설치
- 케이블트레이 관통부 내화채움, 기계실 급수배관 설치, 수압테스트 및 보온재 설치
- 스프링클러 주배관 용접, 프리액션밸브 설치, 조리실 급기유니트 설치</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td><td>84%
/
92%</td></tr>
</table>



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 9. 30.기준

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="2">장평고등학교
교사 신축공사</td><td>학 급 수</td><td>31
(일반30,특1)</td><td>개교 예정일</td><td colspan="2">2027. 3. 1.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">개 요</td><td>위 치</td><td colspan="6">경상남도 거제시 장평동 127</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td colspan="6">12,003.90㎡</td></tr>
<tr><td>연 면 적</td><td colspan="6">15,600.76㎡(지상5층)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">설 계
및
협 의</td><td rowspan="2">시 행 일</td><td rowspan="2">2024. 9. 13.</td><td rowspan="5">공 사</td><td>시 행 일</td><td colspan="2">2025. 4. 15.</td></tr>
<tr><td>계 약 일</td><td colspan="2">2025. 6. 24.</td></tr>
<tr><td>계 약 일</td><td>2024. 9. 30.</td><td>공사기간</td><td colspan="2">2025.7.14.~ 2027.1.13.(18개월)</td></tr>
<tr><td>용역기간
(기본+실시)</td><td>2024. 10. 8.~ 2025. 4. 5.</td><td>도 급 자</td><td colspan="2">(건축) 승전종합건설㈜ 이동수
(기계) 세영산업(주) 박원
(전기) ㈜명성전력 이소원
(통신) 진우전자 모왕갑
(소방) 선무전기공사 문진길</td></tr>
<tr><td>시행계획협의</td><td>2025. 2. 18.</td><td>건설사업
관리용역</td><td>대 표 사</td><td colspan="2">㈜엄&이종합건축사사무소</td></tr>
<tr><td>작업내용</td><td colspan="4">* 건축, 토목공사
- (강당동 A존) 4층 기둥 및 벽체 형틀 설치, 5층 슬라브 및 보 형틀 설치, CONC 타설, 철골앙카 설치
- (교사동 A존) 4층 기둥 및 벽체 철근 조립, 형틀·동바리 설치, 5층 바닥 보 및 슬라브 형틀 설치 및 단열재 깔기, 철근조립, CONC 타설, 인서트 설치
- (교사동 B존) 4~5층 바닥 CONC 타설, 바닥 보 및 슬라브 형틀 제작 및 설치, 철근 조립, 천정 인서트 설치, 지하층 콘크리트 블록 및 벽돌 쌓기, 계단실 내외벽 미장 및 견출
- L형 옹벽 5구간 기초 터파기, 버림 CONC 타설, 외부 시스템 비계 설치
* 기계, 전기, 통신, 소방공사
- 4~5층 바닥, 벽체 배관 및 관통 슬리브, 1~2층 케이블트레이 설치 및 입선
- 4~5층 통신/TV/방송/CCTV배관, 소화함 설치, 지하1~지상2층 소방 기계배관, 급식실 사각 덕트 작업</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td><td>55%
/
58%</td></tr>
</table>



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 9. 30.기준

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="2">석금산중학교
교사 신축공사</td><td>학 급 수</td><td colspan="2">19
(일반18,특수1)</td><td>개교 예정일</td><td colspan="2">2027. 3. 1.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">개 요</td><td>위 치</td><td colspan="7">양산시 동면 금산리1452-1</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td colspan="7">10,000.00㎡</td></tr>
<tr><td>연 면 적</td><td colspan="7">8,255.35㎡(지상3층)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">설 계
및
협 의</td><td>시 행 일</td><td colspan="2">2024. 7. 7.</td><td rowspan="3">공 사</td><td>시 행 일</td><td colspan="3">2025.6.16.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">계 약 일</td><td colspan="2" rowspan="2">2024. 10. 23.</td><td>계 약 일</td><td colspan="3">2025.9.2.</td></tr>
<tr><td>공사기간</td><td colspan="3">2025.9.5.~2027.2.26.(18개월)</td></tr>
<tr><td>용역기간
(기본+실시)</td><td colspan="2">2024. 11.1. ~ 2025. 4. 29.</td><td>도 급 자</td><td colspan="3">(건축) 도현건설㈜ 이철수
(전기) 영일전기 정기진
(통신) ㈜비에스정보통신 우봉석
(소방) 조아텍㈜ 박신이
(기계) ㈜삼양설비 김중수</td></tr>
<tr><td>시행계획협의</td><td colspan="2">2025. 4. 2.</td><td>건설사업
관리용역</td><td>대 표 사</td><td colspan="3">㈜선진엔지니어링종합건축사사무소</td></tr>
<tr><td>작업내용</td><td colspan="5">* 건축공사
- 외부 치장벽돌쌓기(줄눈넣기), 금속판넬붙이기, 알미늄시트붙이기
- 내부 벽체 및 바닥미장, 화장실 등 방수
- 옥외지킴이실 외부 치장벽돌쌓기(줄눈넣기)
- 옥상 난간대 설치
* 기계,전기,통신,소방공사
- 무대장치 설치(관급자)
- 급수배관 보온, 내화충진재 작업
- 전기 케이블 트레이 설치, 1~4층 입선
- 통신 방송 입선, 소방 주 배관 용접 및 스프링클러 설치</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td><td>64%
/62%</td></tr>
</table>




현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 9. 30.기준

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="2">신문1지구초등학교
교사 신축공사</td><td>학 급 수</td><td colspan="2">47
(일반45, 특2)</td><td>개교 예정일</td><td colspan="2">2028. 3. 1.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">개 요</td><td>위 치</td><td colspan="7">경상남도 김해시 신문동 377일원</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td colspan="7">15,000㎡</td></tr>
<tr><td>연 면 적</td><td colspan="7">16,127.33㎡(지상4층)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">설 계
및
협 의</td><td>시 행 일</td><td colspan="2">2024. 8. 7.</td><td rowspan="4">공 사</td><td>시 행 일</td><td colspan="2">2026. 3. 19.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">계 약 일</td><td colspan="2" rowspan="2">2024. 11. 14.</td><td>계 약 일</td><td colspan="2">2026. 6. 26.</td></tr>
<tr><td>공사기간</td><td colspan="2">2026.7.10.~2028.1.30.(19개월)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">용역기간
(기본+실시)</td><td rowspan="2">2024. 11. 20.~ 2025. 5. 18.</td><td rowspan="2">도 급 자</td><td colspan="2" rowspan="2">(건축) 화성종합건설주식회사 최순탁
(전기) 성은전기 황용태
(통신) 주식회사씨앤시스 양대근
(소방) 유한회사 부건소방설비 정준호
(기계) 주식회사 삼열에너지 박연주</td></tr>
<tr><td>시행계획협의</td><td colspan="2">2025. 4. 14.</td><td>건설사업
관리용역</td><td>대 표 사</td><td colspan="2">㈜케이디엔지니어링건축사사무소 박효열</td></tr>
<tr><td>작업내용</td><td colspan="4">* 건축, 토목공사
- 항타기 조립 및 시항타/동재하시험/자분탐상검사/부상토정리
- 파일천공 및 근입(134공/786공)
- 항타항발기 안전점검
- 소음 및 진동측정기 설치
* 전기, 통신, 소방, 기계공사
- 현장사무실 컨테이너 설치, 설계도서 검토</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td><td colspan="2">4%
/
4%</td></tr>
</table>

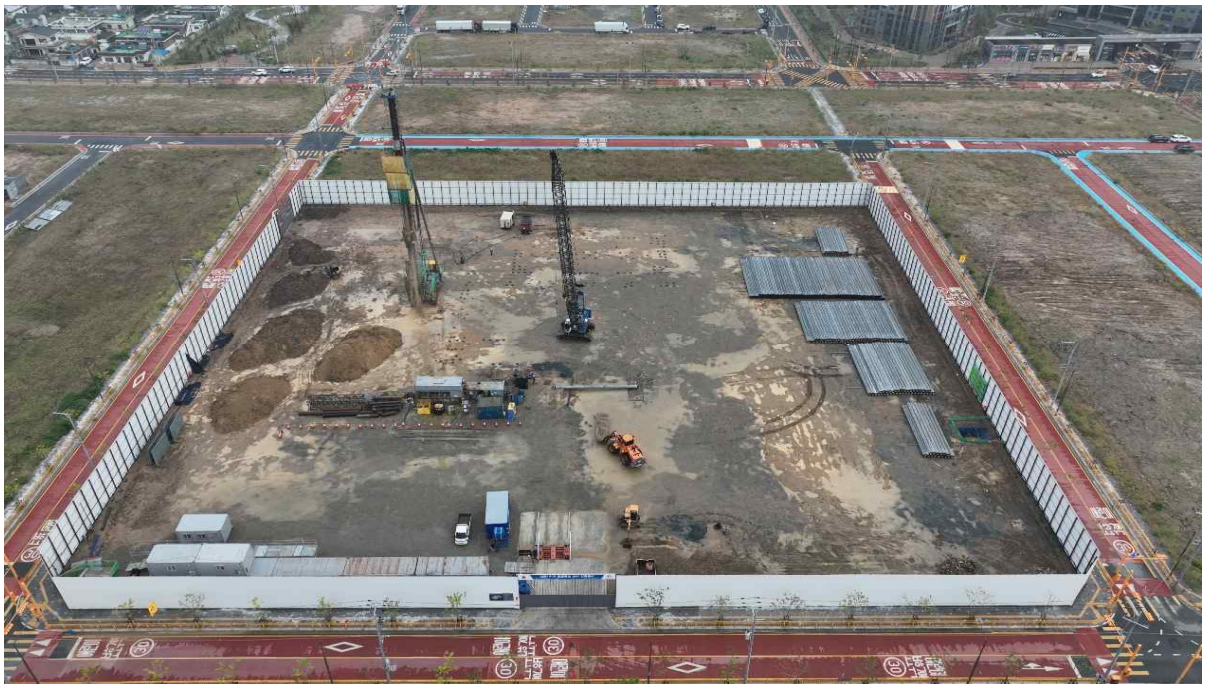

현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 9. 30.기준

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="2">의창중학교
교사 신축공사</td><td>학 급 수</td><td colspan="2">16
(일반15, 특1)</td><td>개교 예정일</td><td colspan="2">2028. 3. 1.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">개 요</td><td>위 치</td><td colspan="7">경상남도 창원시 의창구 중동 791</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td colspan="7">13,884.4㎡</td></tr>
<tr><td>연 면 적</td><td colspan="7">7,335.98㎡(지하1층/지상3층)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">설 계
및
협 의</td><td>시 행 일</td><td colspan="2">2025. 5. 16.</td><td rowspan="4">공 사</td><td>시 행 일</td><td colspan="2">2026. 3. 24.</td></tr>
<tr><td>계 약 일</td><td colspan="2">2025. 5. 29.</td><td>계 약 일</td><td colspan="2">2026. 7. 2.</td></tr>
<tr><td>용역기간
(기본+실시)</td><td colspan="2">2025. 6. 4. ~ 2025. 11. 30.</td><td>공사기간</td><td colspan="2">2026.7.20.~2027.12.19.(17개월)</td></tr>
<tr><td>시행계획협의</td><td colspan="2">2025. 11. 21.</td><td>도 급 자</td><td colspan="2">(건축) 주식회사 이엔에프건설 진학명
(전기) 주식회사 진삼전기 김윤식
(통신) 조양정보통신 이은희
(소방) ㈜제이원엔지니어링 장세선
(기계) 승원엔지니어링 조상현</td></tr>
<tr><td>건설사업
관리용역</td><td>대 표 사</td><td colspan="2">주식회사 청우종합건축사사무소 연동익</td></tr>
<tr><td>작업내용</td><td colspan="4">* 건축, 토목공사
- 헬리컬 파일 본항타(419본/606본)
- 기계실 및 피트층 기초철근배근
- 강당동 필로티 독립기초 Con'c타설
- 토취장 선정 검토
* 전기, 통신, 소방, 기계공사
- 캠로드 접지 작업, 현장사무실 컨테이너 설치, 설계도서 검토</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td><td colspan="2">8%
/
8%</td></tr>
</table>



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 9. 30.기준

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="2">대곡고등학교
교사 이전 신축공사</td><td>학 급 수</td><td colspan="2">22
(일반21, 특1)</td><td>개교 예정일</td><td colspan="2">2028. 3. 1.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">개 요</td><td>위 치</td><td colspan="7">경상남도 진주시 충무공동 76-1번지</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td colspan="7">13,749.60㎡</td></tr>
<tr><td>연 면 적</td><td colspan="7">9,997.85㎡(지상4층)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">설 계
및
협 의</td><td>시 행 일</td><td colspan="2">2025. 6. 4.</td><td rowspan="3">공 사</td><td>시 행 일</td><td colspan="2">2026. 4. 9.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">계 약 일</td><td rowspan="2">2025. 6. 18.</td><td>계 약 일</td><td colspan="2">2026. 7. 22.</td></tr>
<tr><td>공사기간</td><td colspan="2">2026.7.31.~2028.1.21.(18개월)</td></tr>
<tr><td>용역기간
(기본+실시)</td><td colspan="2">2025. 6. 23.~ 2025. 12. 19.</td><td rowspan="2">도 급 자</td><td colspan="2" rowspan="2">(건축)동영종합건설(주) 변기석
(전기)주식회사 하남엔지니어링 강철호
(통신)주식회사 이루시스 김종우
(소방)(주)금성소방 구중근
(기계)주식회사 금오중공업 김태규</td></tr>
<tr><td>시행계획협의</td><td colspan="2">2025. 12. 4.</td><td>건설사업
관리용역</td></tr>
<tr><td>작업내용</td><td colspan="4">* 건축, 토목공사
- 도면 검토 및 계획서 작성
- RPP방음벽 가설울타리 자재 반입 및 설치
- 게이트 설치 및 주진입로 정비
- 현장 부지 정지
- L형 옹벽 터파기
- 버림콘크리트 타설
* 전기, 통신, 소방, 기계공사
- 현장사무실 컨테이너 설치, 설계도서 검토</td><td>대 표 사</td><td colspan="2">주식회사 경호엔지니어링종합건축사사무소 조영수</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td>공 정 률
(진행/예정)</td><td colspan="2">2%
/
2%</td></tr>
</table>



현 황 사 진
